




PLAN DE INVERCION MUNICIPAL PPM-2025
Informe de Avances de Ejecución de Obras
Trimestre Enero - Marzo 2025



PLAN DE INVERCION MUNICIPAL, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2025

OBRAS PROGRAMADAS	SECCION	PRESUPUESTO ASIGNADO RD\$	PRESUPUESTO EJECUTADO RD\$	NIVEL DE AVANCE %	ESTADO DE EJECUCION
Adquisición y Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades: Las Aromas, La Ceiba, La Ceiba Afuera, La Ceiba Adentro, Campeche,	La Ceiba	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50 %
Adquisición y Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades: Santa Ana, La Gina, La Cuarenta, Madrid, Rancho Viejo, Arenoso y	Santa Ana	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50 %
Adquisición y Colocación de lámparas led para el alumbrado público de las comunidades: San José, Sabana Angosta, El Coco Central, El Coco I, El Coco II,	San Jose	480,000.00	235,882.00	49.14%	Ejecutada 50 %
Construcción de Rampas de acceso universal en oficinas de servicios públicos, entidades bancarias, parques y plazas	Zona Urbana	80,000.00	84,872.00	106.09%	Terminada 100%
Acondicionamiento del Centro Comunitario e Instalación de Tendido Eléctrico en el Sector Las Guásimas.	Los Limones	240,000.00	247,982.00	103.33%	Terminada 100%
Adquisición y Colocación de Alcantarilla en el sector El Play de Los Limones.	Los Limones	240,000.00	248,340.00	103.48%	Terminada 100%
		2,000,000.00	1,288,840.00		


NIVEL DE AVANCE PPM-2025

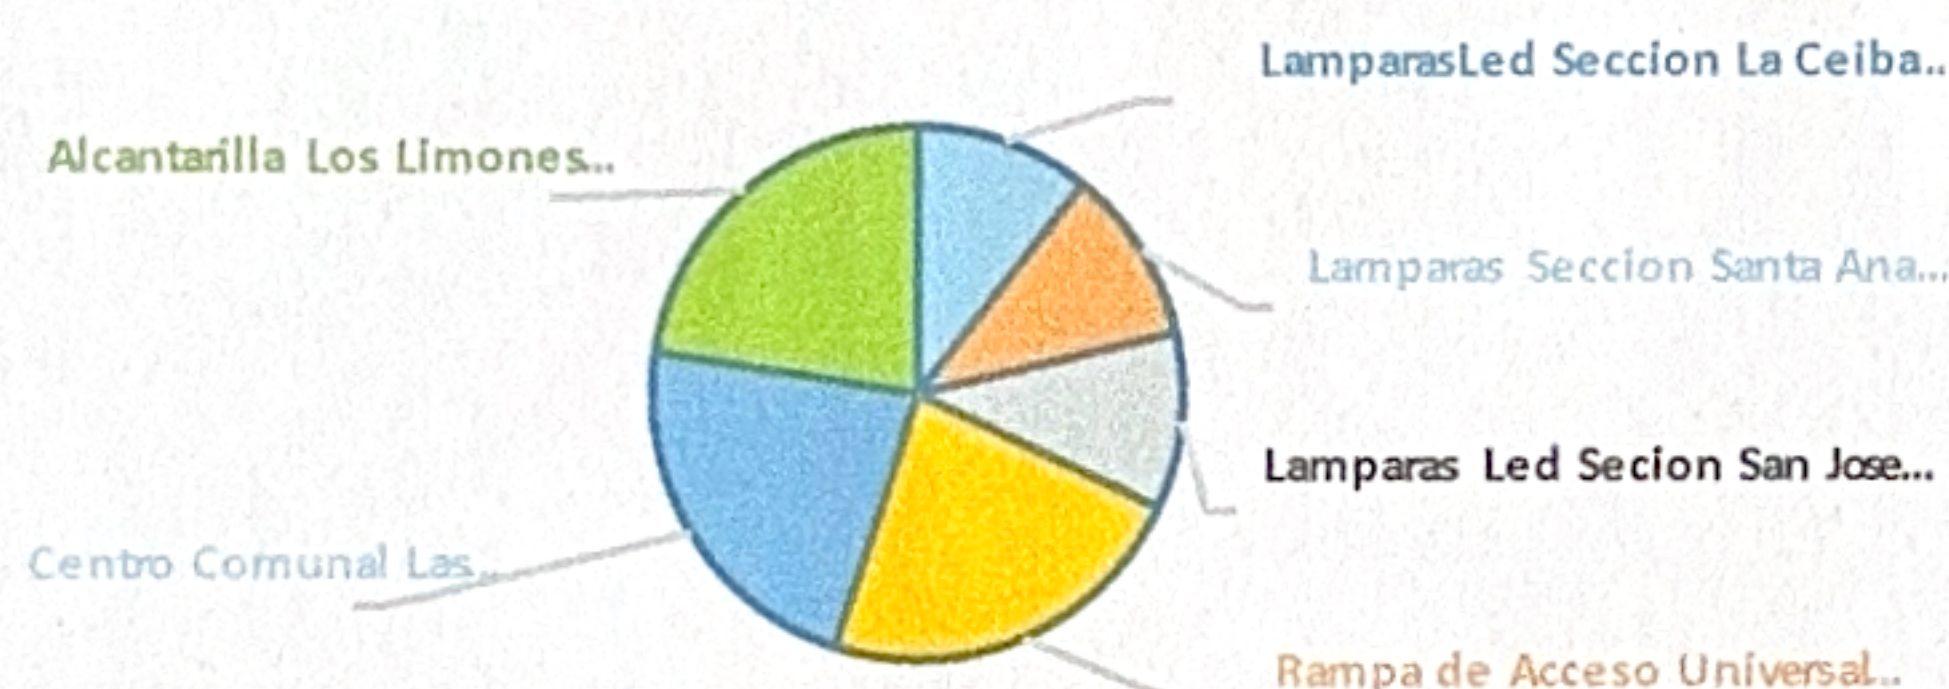

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PPM- 2025.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	NIVEL DE AVANCE %
Obras Ejecutadas 100%	3	50%
Obras en Proceso de Ejecucion	3	50%
Obras pendientes por Iniciar	0	0%
TOTAL	6	100%

BALANCE EJECICION

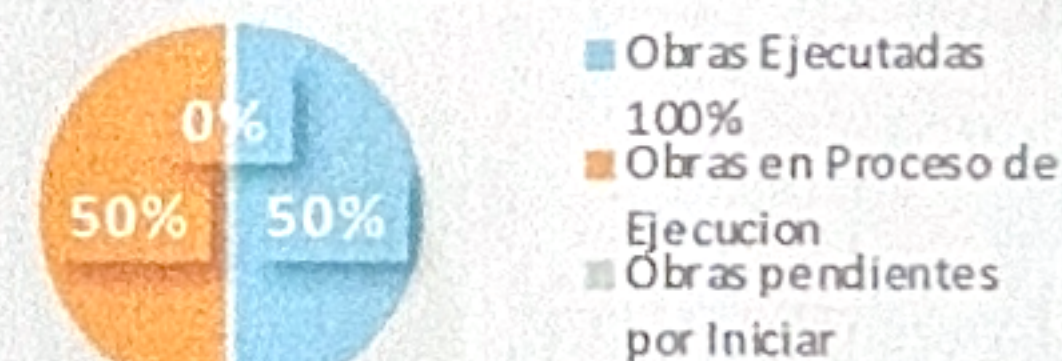

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PPM- 2025.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA ASIGNADO PPM-2025 RD\$	PRESUPUESTO EJECUTADO RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN RD\$	NIVEL DE AVANCE %
2,000,000.00	1,288,840.00	711,160.00	64%

RAQUEL ROSANNA ROSARIO JORGE
Alcaldesa Municipal



ISRAEL RODRIGUEZ MERCADO
Enc. Planificación y Programación
